



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

งานควบคุมงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกันยายน 2565

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๙๔. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๒
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๒ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - คลองข้างเมือก กับ หจก.ห้วยโคก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอขยายเวลาในการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นออกไป เนื่องจากสองข้างทางมีต้นยูคาลิปตัสอยู่มาก ต้องขุดออก และทั้งสองข้างทางเป็นที่นาของราษฎรได้ปลูกข้าว การขุดตอยูคาลิปตัสอาจทำให้ข้าวในนาของราษฎรได้รับความเสียหาย จึงเห็นสมควรขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีกเป็นเวลา ๖๐ วัน จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพรธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยโคก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ)

รองปลัด อบต.ห้วยโคก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ห้วยไต่ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมพร เตื่อไธสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยไต่ก

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

นางสมพร กอคุณกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

นายระวี พยุงแสนกุล

(ลงชื่อ).....
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ พร ๘๘๒๐๓/๒๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก

๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ สายทางแยกทางหลวงชนบท พร.๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๕๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๑๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	-	-	-	-	-	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ พิเศษ)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยเก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโคก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโคก

ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโคกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก

๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ สายทางแยกทางหลวง

ชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน
ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๑ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์						
ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ซ้ายคำ.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชิฟไสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพรธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.
๓๐๐๖ - คลองข้างเผือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพริบติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพรธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซี่งสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.ห้วยโคกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓๒๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก

๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ สายทางแยกทางหลวง

ชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างเมือก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๔๔ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐				
หัวหน้าคนงาน	-	-	-				
คนงาน	-	-	-				
รถผสมปูน	-	-	-				
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-				
รถไถ	-	-	-				
รวม	-	-	-				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)


(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟไธสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย


กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.
๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.

๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหายโศก หมู่ที่ ๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ที่ บร 88203/๒๕๖๐

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานประจำเดือน กันยายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	17 วัน (28.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)

แผนที่ผังบริเวณที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เลขอร์ที่ไม่มีชื่อ)



จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างถนนค
สล.



จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างถนนค
สล.



แนวก่อสร้างถนนคสล.

สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร.3006 - คลองข้างฝือก ช่วงที่ 1
หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



1 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

1.1 ผู้ดำเนินการ

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง เลขที่ 50 หมู่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1.2 สัญญาจ้าง

ชื่อสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
เริ่มสัญญาจ้าง 19 สิงหาคม 2565
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 17 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาก่อสร้างรวม 60 วัน
จำนวนงวดงานตามสัญญา 1 งวด
ต่อสัญญาถึงวันที่ -
รวมระยะเวลาที่ต่อสัญญา - วัน
ราคาค่อก่อสร้าง 492,000.00 บาท
ค่าปรับวันละ 492.00 บาท

1.3 ลักษณะและขอบเขตงาน

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

1.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1	นายวรพงษ์ วรกิจ	ประธานกรรมการ
2	นางสาววรรณภา ชีฟูไธสง	กรรมการ
3	นางสมพร เตื่อไธสง	กรรมการ

1.5 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1	นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง	ผู้ควบคุมงาน
---	-----------------------	--------------

1.6 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

นายสุวิทย์ ผิวขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ที่ บร 88203/๕๐๖ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 251/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง ข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่ม ทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

[] ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

[] เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ซึ่ง

() เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

() เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีฟไธสง)

(นางสมพร เตื้อไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203/วค๖

วันที่ 6 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ค่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	41 วัน (68.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน


วันที่	31	1	2	3	4	5	6
หัวหน้าคนงาน/ช่าง คนงาน/กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	31	1	2	3	4	5	6
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	31	1	2	3	4	5	6
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงศ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
31 สิงหาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
1 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 กันยายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
	รวม	-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203 *วค/ค* วันที่ 13 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 5/2565 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีฟไชสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไชสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	34 วัน (56.67 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไชสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อไชสง)

กรรมการฯ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
7 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 กันยายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก


วันที่	7	8	9	10	11	12	13
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
	รวม	-		รวม		-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/5410

วันที่ 20 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีฟไชสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตือไชสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0.00	ยังไม่ทำงาน	27 วัน (45 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไชสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไชสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตือไชสง)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
14 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
19 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นไชย


วันที่	14	15	16	17	18	19	20
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
แจ่มใส							
ฝนตก							
เล็กน้อย ปานกลาง หนัก							
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเลอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
รวม		-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203 *วสค*

วันที่ 27 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	20 วัน (33.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(Signature)
(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(Signature)
(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(Signature)
(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(Signature)
(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการฯ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
21 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
22 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
23 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
26 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 กันยายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่	21	22	23	24	25	26	27
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ


วันที่	21	22	23	24	25	26	27
แจ่มใส							
ฝนตก							
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	21	22	23	24	25	26	27
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถแทรกเตอร์							
รถบรรทุก							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถแทรกเตอร์							
เครื่องมือช่างปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

(นายฐิติพงษ์ แคว้นโรสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203/๒๖๐

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	13 วัน (33.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตือไธสง)

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่	28	29	30	1	2	3	4
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	28	29	30	1	2	3	4
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	28	29	30	1	2	3	4
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ที่ บร 88203-409

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-14 วัน (-23.33 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๒๐๑๗ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 251/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง ข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่ม ทำงานจ้างวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่

() เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

() เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....22.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แก้วนไชสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไชสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไชสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๒๐๖

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 9/2565 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา	จำนวนงวดงาน		เบิกงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	6 วัน (10 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐดิพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการ

(นางสมพร เตือไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
	รวม	-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
5 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
7 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโตก


วันที่	5	6	7	8	9	10	11
หัวหน้าคนงาน/ช่าง คนงาน/กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	5	6	7	8	9	10	11
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	5	6	7	8	9	10	11
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0


 (นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)
 ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/12014

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 10/2565 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-1 วัน (-1.67 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื้อไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
รวม		-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
12 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


วันที่	12	13	14	15	16	17	18
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	12	13	14	15	16	17	18
แจ่มใส							
ฝนตก							
	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	12	13	14	15	16	17	18
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิตติพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203/๒๐๓

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 11 สัปดาห์ที่ 11/2565 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0.00	ยังไม่ทำงาน	-8 วัน (-13.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการฯ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
รวม		-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
19 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
21 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
22 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
23 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก


วันที่	19	20	21	22	23	24	25
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่		19	20	21	22	23	24	25
แจ่มใส								
ฝนตก	เล็กน้อย							
	ปานกลาง							
	หนัก							
ฝนตกเวลา								

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	19	20	21	22	23	24	25
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0


(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)
ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๒๐๕ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-15 วัน (-25 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นายรัฐดิพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการฯ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
	รวม	-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
26 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
28 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
29 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
30 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
31 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
1 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวายไศย


วันที่	26	27	28	29	30	31	1
หัวหน้าคนงานช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	26	27	28	29	30	31	1
แจ่มใส							
ฝนตก							
เล็กน้อย ปานกลาง หนัก							
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	26	27	28	29	30	31	1
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกาตเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายฐิติพงศ์ แคว้นโรตอง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผู่วิชา)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203/๒๐๕ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 13 สัปดาห์ที่ 13/2565 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-22 วัน (-25 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-
รวม		-	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

- ไม่มี
- มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
2 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
7 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก


วันที่	2	3	4	5	6	7	8
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	2	3	4	5	6	7	8
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	2	3	4	5	6	7	8
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเลอร์							
รถแทรกเลอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0


 (นายจิตติพงศ์ แคว้นไชสง)
 ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผัวข่าง)
 ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203/๒๑๖ วันที่ 15 ธันวาคม 2565


เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ที่ 251/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ต่อสัญญาจ้างจาก วันที่ 18 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น


บัดนี้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้างและส่งมอบงวดงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 16 ธันวาคม 2565


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายรติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (นางสมพร เตื้อไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร. 88203 *๒๖๕* วันที่ 15 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ที่ 251/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง
ข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หลายโคกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร.3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่ม
ทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ขยายระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่
18 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่งฯ/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้า
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

- ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
 - เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ซึ่ง
 - เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
 - เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน
- โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

-

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตือไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร. 88203 *สก*

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 14 สัปดาห์ที่ 14/2565 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-29 วัน (-48.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการฯ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	-	-	-	-
รวม		100.00	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
9 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไทร


วันที่	9	10	11	12	13	14	15
หัวหน้าคนงาน/ช่าง คนงาน/กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0


(นายจิตพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร. 88203/๒๐๐

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 15 สัปดาห์ที่ 15/2565 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-36 วัน (-60 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายวิฑิตพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื้อไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	-	-	-	-
	รวม	100.00		รวม		-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
16 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
19 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
21 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
22 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
หัวหน้างาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร. 88203/๒๑๑

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 16 สัปดาห์ที่ 16/2565 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลายโคก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีฟไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0.00	ยังไม่ทำงาน	-43 วัน (-71.67 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการฯ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	-	-	-	-
รวม		100.00	รวม			

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
23 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
26 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
28 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
29 พฤศจิกายน 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัตพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร. 88203/๒๑๒

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 17 สัปดาห์ที่ 17/2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหายโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญา จ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีฟไชสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไชสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-50 วัน (-83.33 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงศ์ แคว้นไชสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไชสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื้อไชสง)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	-	-	-	-
รวม		100.00	รวม			-

ปัญหา - อุปสรรค

- ไม่มี
- มี ดังนี้

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
30 พฤศจิกายน 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
1 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 ธันวาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนรถขุด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันที่	30	1	2	3	4	5	6
จำนวนรถขุด							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ


วันที่	30	1	2	3	4	5	6
ฝนตก							
แดด							
รวม							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	30	1	2	3	4	5	6
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

(นายจิติพงศ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ที่ บร. 88203/๒๖๓

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 18 สัปดาห์ที่ 18/2565 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ค่อสัญญา จ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีฟไชสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไชสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
90	เร็ว	ก่อสร้างคงเหลือ -57 วัน (-83.33 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีฟไชสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไชสง)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	-	90.00	90.00	90.00
	รวม	100.00		รวม		

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
7 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทาง	
8 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ลงทรายรองพื้นถนนพร้อมปรับเกลี่ยระดับทรายไถงานผิวทางคอนกรีต งานตีแบบถนน, งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
9 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานถอดแบบถนน, งานตีแบบถนนปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทางพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
10 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานถอดแบบถนน, งานตีแบบถนนปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทางพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
11 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานถอดแบบถนน, งานตีแบบถนนปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทางพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
12 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานถอดแบบถนน, งานตีแบบถนนปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทางพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
13 ธันวาคม 2565	[] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [<input checked="" type="checkbox"/>] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานถอดแบบถนน, งานตีแบบถนนปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทางพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตถนนพร้อมแต่งผิวจราจรและบ่มคอนกรีตถนน	เช็คสลัมคอนกรีต Slump Test เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไทร


วันที่	7	8	9	10	11	12	13
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	1	1	1	1	1	1	1
ขับรถ,กรรมกรฯ	1	10	9	9	9	9	9
รวม	2	11	10	10	10	10	10

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole	1	1					
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์	1	1	1	1	1		1
รถปูน Ready Mixed		3	3	3	3	3	3
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ		1					
รถเทเลอร์		1	1				
เครื่องมืองานปูน		5	5	5	5	5	5
รวม	2	12	10	9	9	8	9



(นายรติพงษ์ แคว้นโรง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผัวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

ที่

บร. 88203/๒๑๔

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 19 สัปดาห์ที่ 19/2565 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโตก หมู่ที่ 2 สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. 3006-คลองช้างเผือก ช่วงที่ 1 สถานี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโตก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สัญญาจ้างเลขที่ 046/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวม 60 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโตกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
100	เร็ว	-58 วัน (-96.67 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	90.00	10.00	100.00	100.00
	รวม	100.00	รวม			100.00

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
14 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานลงดินลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งสไลป์ไหล่ทาง งานหยอดขี้เถ้าคอรอยต่อถนน เก็บรายละเอียดงาน,ขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ	
15 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	
16 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	
17 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	
18 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	
19 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	
20 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก


วันที่	14	15	16	17	18	19	20
หัวหน้าหน่วยงานช่าง	1						
คนงานกรรมกร	9						
รวม	10	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhoe							
รถกวาดแฉะ							
รถบรรทุกแฉะ							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ	1						
รถเทแฉะ	1						
เครื่องมืองานปูน							
รวม	2	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน






(นายสุวิทย์ มีขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

รูปถ่ายก่อนดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

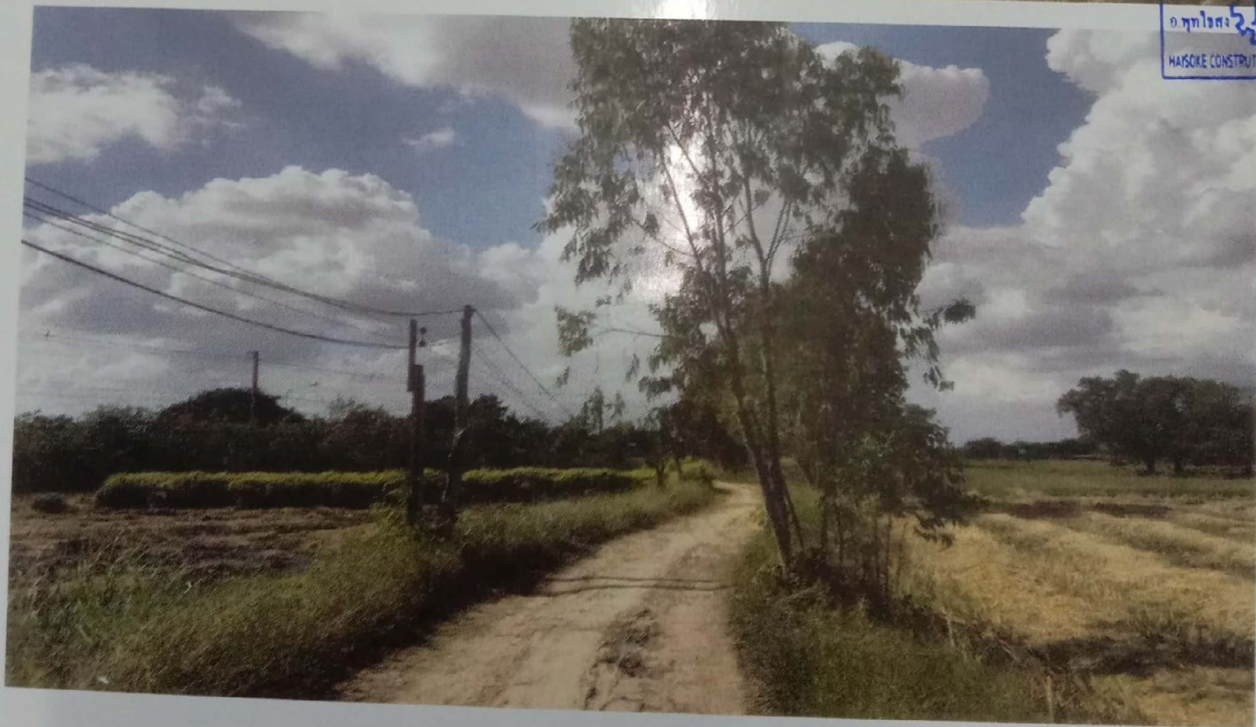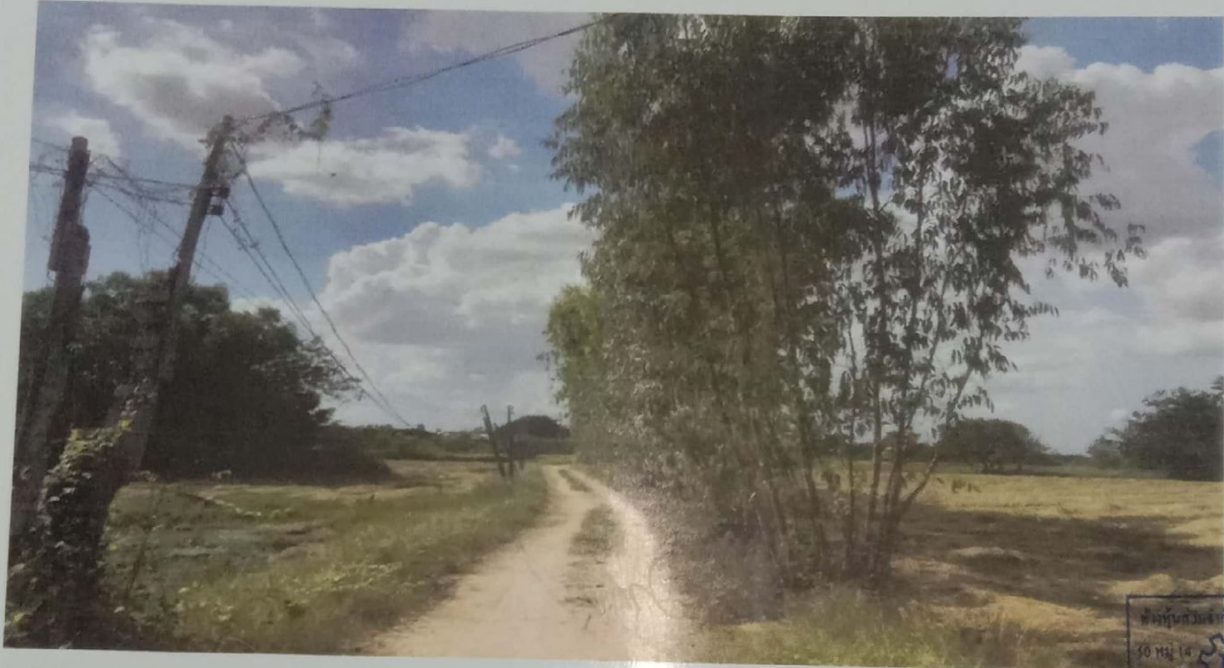


(ลงชื่อ) 
(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)


๑. นายบรรพชต์ วรกิจ


..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง


..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อไธสง


..... กรรมการ

รูปถ่ายขณะดำเนินการ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างเฝือก ช่วงที่ ๑



นายโตกก่อสร้าง
ค.หอโตก
จ.บุรีรัมย์
HAISCHE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นโสม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายบรรพต วกิจ




ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพโสม



กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อโสม



กรรมการ

รูปถ่ายขณะดำเนินการ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑



บริษัท
ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยก
ทางหลวงชนบท
บร.๓๐๐๖
ช่วงที่ ๑
MUSKETEER CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



(ลงชื่อ)




ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นโรสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง



กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโรสง




กรรมการ

รูปถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑




(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายริตพงษ์ แคว้นไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)


๑. นายวรพงษ์ วรกิจ

 ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชิพไธสง

 กรรมการ

๓. นางสมพร เตือไธสง

 กรรมการ

รูปถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างเผือก ช่วงที่ ๑



ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายใจ
50 หมู่ 14
อ.สุพรรณบุรี
H
HASOKE CONSTRUCTION LIMITED



(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ


๓. นางสมพร เตื้อไธสง




กรรมการ

รูปถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองข้างฝือก ช่วงที่ ๑

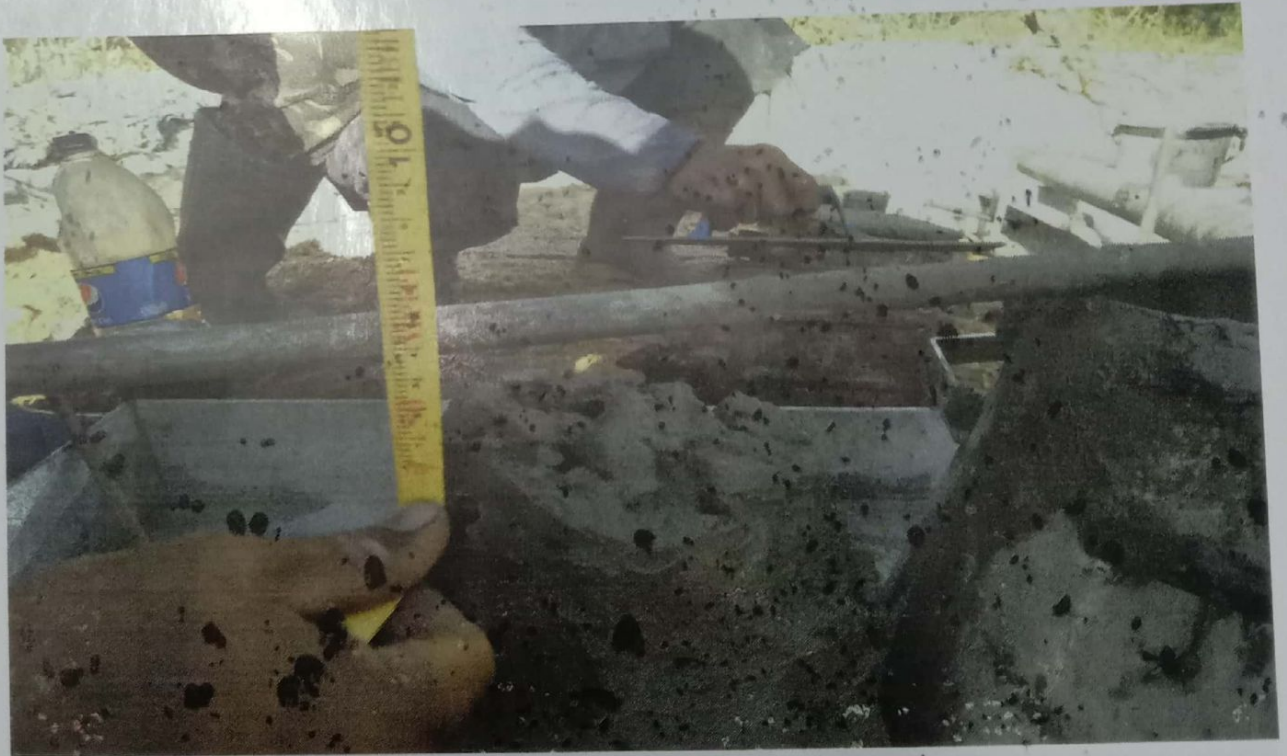

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายรติพงศ์ แคว้นไธสง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ



ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อไธสง



กรรมการ

รูปถ่ายขณะดำเนินการ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงชนบท บร.๓๐๐๖ - คลองช้างเผือก ช่วงที่ ๓



โรงเรียนวิศวกรรม
สาขาวิชา
วิศวกรรม
H
SCHOOL OF ENGINEERING



(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจวิברานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟไธสง กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการ
